


**BV: SANIERUNG / REKONSTRUKTION DOPPELSTUBENUMGEBINDEHAUS**  
**Bauort: Rämischstr. 23, 02681 Schirgiswalde**  
**Bauherr: Umgebindehaus Rämischstr. 23 e.V.**

Hausseite	BESTAND	PLANUNG
<b>Nordseite (Straßenansicht)</b>		 1. und 2. (nach Befund auszuführende) Farbvariante
<b>Süd-West-Seite</b>		 2. Farbvariante (mit Wiederherstellung ehem. Oberlaube)

## BAUTAGEBUCH

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	<b>2024</b>
------	------	------	------	------	------	------	-------------

**BAUBEGINN ist der 30.03.19.**

Ein Bautagebuch wird auf der Baustelle detailliert geführt über die Ausführung aller in Eigenleistung erfolgten Arbeiten.

Datum/ Zeitraum	Ereignis	
02.01.24	Farbe abgebrannt (Wand Stube 1)	
03.01.24	Farbe abgebrannt (Wand Stube 1) Farbe abgebrannt (Decke Stube 1)	
04.01.24	Farbe abgebrannt (Decke Stube 1)	
05.01.24	Handlanger Elektriker (Anschluss PV-Anlage, Kabelverlegung)  Farbe abgebrannt (Wand Stube 1)  Baustelle aufräumen	  

<p>06.01.24</p>	<p>Fenster gestrichen (für Oberlaube)</p> <p>Verschalung Oberlaube</p> <p>Durchbruch OG WC-Fenster Vorbereitung FW-Reparatur</p> <p>Farbe Tür abbrennen Farbe abgebrannt (Decke Stube 1)</p> <p>Lehmziegeltransport (Verteilung des Lehmziegelbedarfs im Haus, Abtransport des Überschusses)</p> <p>Sanitärraum „winterfest“ gemacht</p>	
<p>08.01.24</p>	<p>Farbe abgebrannt (Decke Stube 1)</p> <p>Jahreszahl „1834“ gefunden! (Seitlich an Deckenbalken unterhalb Einschub in Raummitte Stube 1 (große Stube))</p>	
<p>10.01.24</p>	<p>Farbe Tür abbrennen Farbe abgebrannt (Decke Stube 1)</p>	
<p>12.01.24</p>	<p>Farbe abgebrannt (Decke Stube 1)</p>	

13.01.24


Farbe Tür (Zarge Stube 1)  
abbrennen



Farbe Türblatt abbrennen



Farbe von 1,5 Fensterlaibungen  
abkratzen (Büro OG)

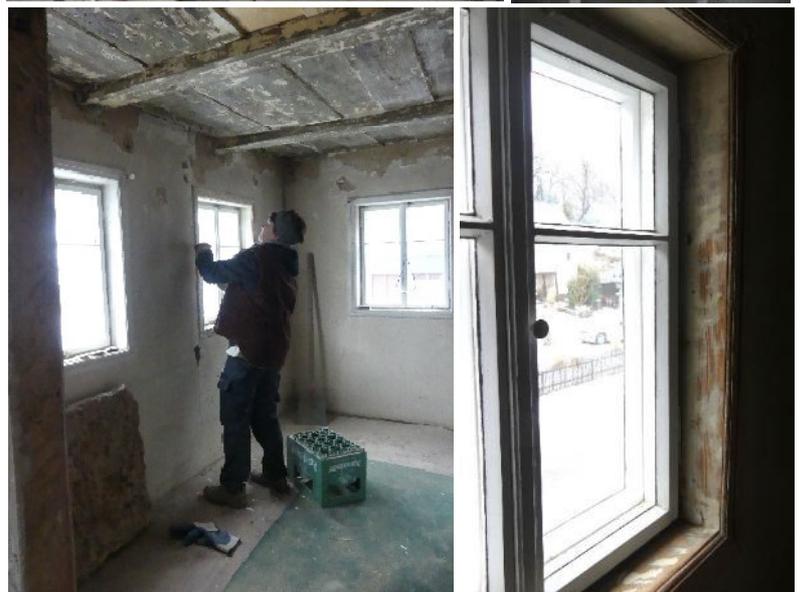

Fachwerk Flur OG für WC-Fenster  
(auch Reparatur)





<p>20.01.24</p> <p>Farbe Blocktür (auch Zarge) abbrennen</p> <p>Farbe abgebrannt (Stube 1)</p> <p>FW der Trennwand zwischen OG-WC und Oberlaube komplett repariert</p> <p>Deckensparschalung und FW im angrenzenden Anbau repariert</p> <p>Abstützen Deckenbalken Büro OG für Trennwand-Unterzugreparatur</p> <p>Gefache der neuen Oberlaube mit Holzfasermatten gedämmt</p> <p>Farbbefund Türblatt Stube 1</p> <p><i>Zuordnung aller im Haus vorhandenen Türen</i></p>	<p>Farbe Blocktür (auch Zarge) abbrennen</p> <p>Farbe abgebrannt (Stube 1)</p> <p>FW der Trennwand zwischen OG-WC und Oberlaube komplett repariert</p> <p>Deckensparschalung und FW im angrenzenden Anbau repariert</p> <p>Abstützen Deckenbalken Büro OG für Trennwand-Unterzugreparatur</p> <p>Gefache der neuen Oberlaube mit Holzfasermatten gedämmt</p> <p>Farbbefund Türblatt Stube 1</p> <p><i>Zuordnung aller im Haus vorhandenen Türen</i></p>	
<p>22.01.23</p>	<p>Farbe abgebrannt (Stube 1)</p>	
<p>23.01.24</p>	<p>Bürodecke (OG) abgebrannt, geschliffen</p>	

<p>24.01.24</p>	<p>Sockelbretter Blockstube West montiert</p> <p>Farbe abgebrannt (Stube 1)</p> <p>Türzarge Farbe abgebrannt</p> <p>Vorraum OG5 beräumt (Vorbereitung der Putzarbeiten)</p>	
<p>25.01. und 26.01.24</p>	<p>Hilfe bei Eit-Installation</p> <p><i>(Endlich ist die Oberleitung deinstalliert!)</i></p>  <p>Befund Trennwandkonstruktion im Anbau: Gips mit Schlacke, bewehrt mit Stroh/(Schilf?)</p>  <p>Reparatur FW-Schaden Trennwand zwischen Büro und Vorraum OG</p>	
<p>AUSBLICK</p>		

aktualisiert: 02.02.24

K. Richter
